

**Bremischer Deichverband**


am linken Weserufer

**Umsetzung Generalplan Küstenschutz  
Bauabschnitt Rablinghausen  
Bauausführung**

**Öffentliche Sitzung des Beirates Woltmershausen  
26.09.2022**

**Dipl. Ing. A. Stief M.Sc.**

# Übersicht Projektgebiet – Unterteilung Abschnitte

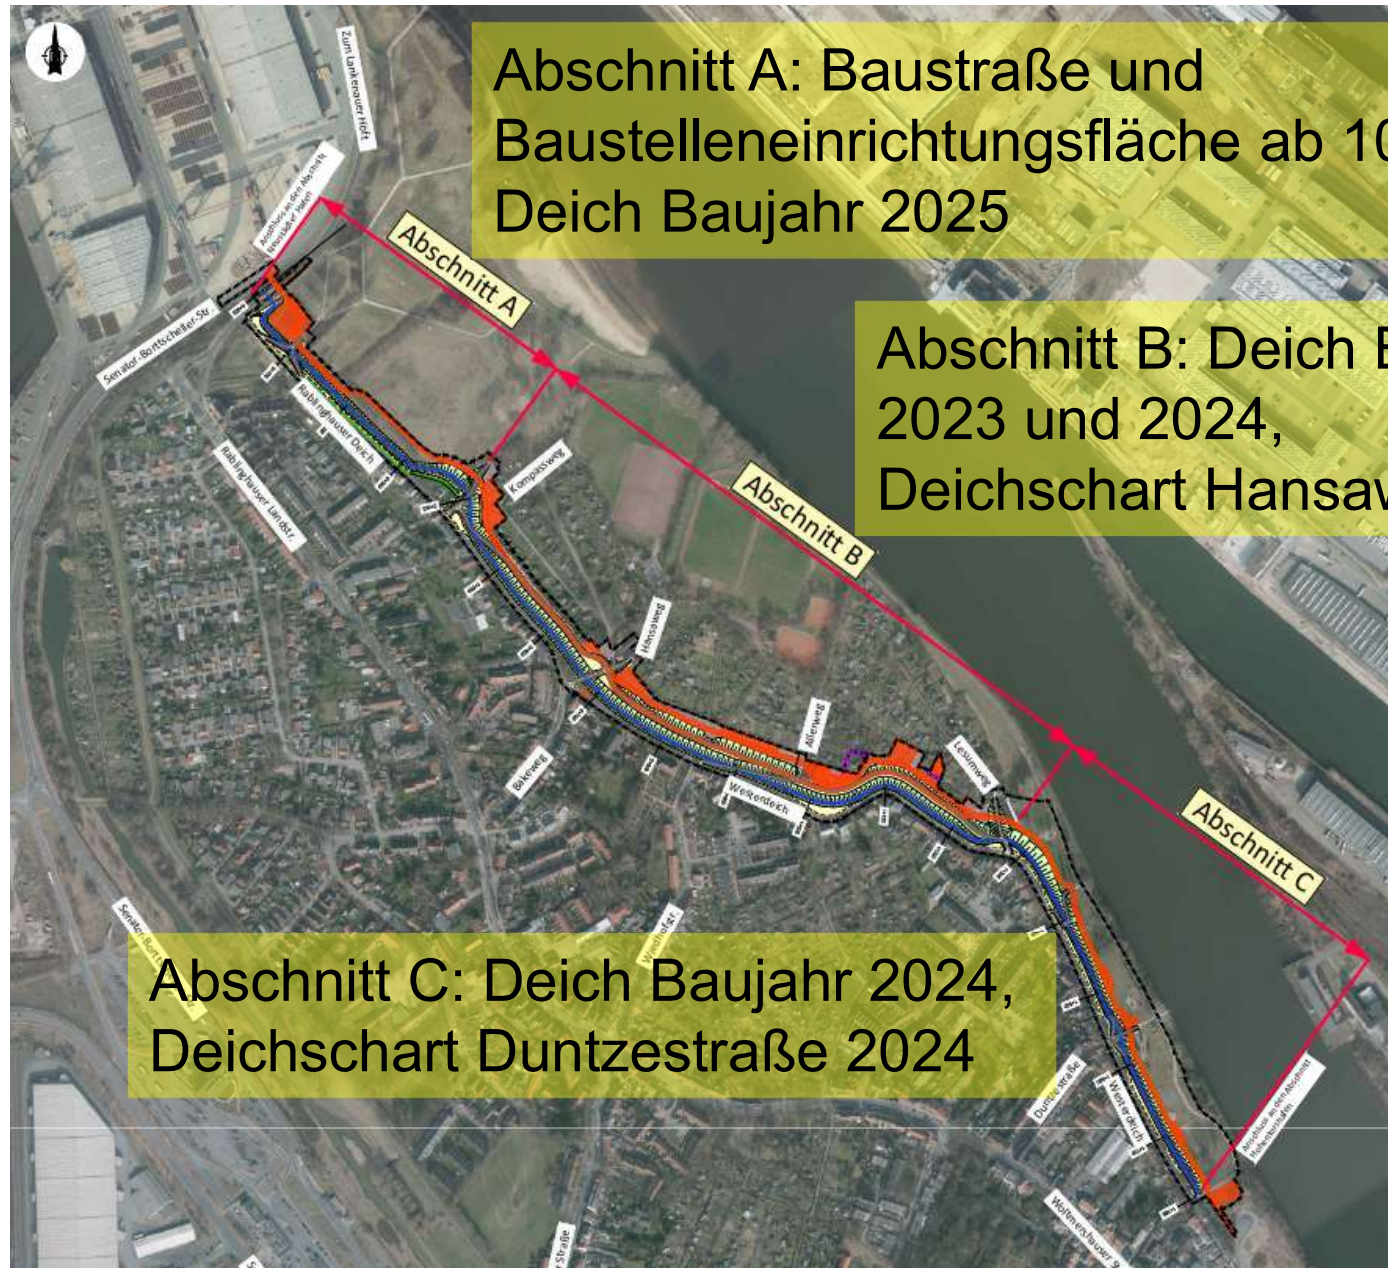

Abschnitt A: Baustraße und Baustelleneinrichtungsfläche ab 10.2022, Deich Baujahr 2025

Abschnitt B: Deich Baujahr 2023 und 2024, Deichschart Hansaweg 2023

Abschnitt C: Deich Baujahr 2024, Deichschart Duntzestraße 2024

26.09.2022

## Bauzeit und Bauausführung

- **Gesamtmaßnahme** Oktober 2022 bis ca. Oktober 2025
- Arbeitszeit Montag bis Freitag max. 8 Stunden, ab 7.00 Uhr
- Transportstrecke durch den Neustädter Hafen: Ausnahmen bilden Transporte vor Herstellung der Transportstrecke und der Abtransport schadstoffhaltiger Materialien
- Einzäunung der Baustelle mit Staubschutz, teilweise Lärmschutz
- Reifenwaschanlage für Transportfahrzeuge während des Erdbaus
- Erhalt der Wegebeziehungen ins Deichvorland mit Verkehrsregelung im Bereich der Querung der Baustraße
- Sicherstellung der Parkmöglichkeiten im Deichvorland (insbesondere Kleingärten)
- **Kompensationsmaßnahmen** Winterhalbjahr 2024/25

26.09.2022

# Bauzeit und Bauausführung Winterhalbjahr 2022/23



- Beginn der **Gehölzfällungen** geplant ab Mitte/Ende Oktober:  
Fällung von ca. 800 Gehölzen, darunter 120 Großbäume  
Lärmschutz durch Lärmschutzmatten am Bauzaun
- **Abbrucharbeiten** in den Kleingärten geplant von November 2022  
bis Februar 2023: Rückbau von 58 Kleingärten
- flankierend Flächensondierung auf **Kampfmittel** und  
Bohrsondierungen geplant im Februar/März 2023
- Bau der **Pfahlreihe** entlang der Straßen Rablinghauser Deich und  
Westerdeich geplant im November 2022: etwa 40 „wilde“  
Parkplätze zwischen den Bäumen entfallen
- ...

26.09.2022



# Bau der Pfahlreihe

Beispiel Abschnitt A



Beispiel Abschnitt B



## Begründungen:

- Hinter der Pfahlreihe beginnt, zukünftig auch im Abschnitt B, die Deichanlage. Die Pfahlreihe wird langfristig erhalten.
- Bäume sind während der Deichbaumaßnahme durch die Pfähle geschützt.
- Parkplätze liegen formal in der Grünanlage, nicht auf der öffentlich gewidmeten Straße.

26.09.2022


# Bauzeit und Bauausführung Winterhalbjahr 2022/2023



...

- Bau der **Transportstrecke** und der asphaltierten Baustraße im Abschnitt A geplant ab Mitte November 2022
- **Beweissicherungen** an Gebäuden an den Straßen  
Rablinghauser Deich 1 bis 45  
Westerdeich 50 bis 151  
geplant ab Oktober 2022, begonnen wird mit den Gebäuden Rablinghauser Deich 21 bis 45

Der **Deichbau** im Abschnitt B beginnt im April 2023 (geplant).  
Informationen bzw. Informationsveranstaltungen dazu folgen.



**Bremischer Deichverband**  
am linken Weserufer

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**
